



# EL PLA DE BARRIS

## BUFA MÉS FORT

**1era reunió Comitè d'avaluació i seguiment**  
**4 de Novembre de 2009**



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Política Territorial  
i Obres Públiques**



ajuntament de  
palafrugell

# ESTEM SATISFETS DE:



- ✿ Implicació de les diferents comunitats de propietaris
- ✿ Alt grau de participació d'algunes associacions i entitats (AAVV del carrer Ample, CEIP Carrilet, Creu Roja)
- ✿ Treball transversal de les àrees municipals
- ✿ Bona acollida de l'Oficina del PB al barri
- ✿ Els resultats i els efectes assolits en els processos participatius realitzats

# A M I L L O R A R :




- 🌸 La comunicació de les actuacions realitzades i/o en execució. Com comuniquem el que fem.
- 🌸 Planificació dels processos participatius en funció dels temps d'execució previstos
- 🌸 Els mecanismes de coordinació entre les diferents àrees implicades en una mateixa actuació
- 🌸 Lideratge de l'AAVV de La Sauleda

		2008	2009
<b>Camp 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds</b>			
1.1	Projecte del Parc Urbà "El Carrilet"	43.112,42	629.762,33
1.8	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi	59.925,40	
<b>Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis</b>			
2.1	Instal·lació d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis de "La Sauleda"		250.000
2.2	Substitució d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis del carrer Ample		246.000
<b>Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà</b>			
5.2	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	100.000	
5.5	Increment dotació de contenidors	11.000	
5.8	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental		2.000
<b>Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments</b>			
6.2	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones		5.000
<b>Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica</b>			
7.1.1	Cohesió social: Acollida al barri		10.000
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri		20.000
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris		28.000
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns		15.000
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educatiu amb infants i adolescents		48.797,80
7.4	Oficina de gestió Pla de Barris		83.394,97
<b>Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques</b>			
8.3	Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda	7.400	
8.4	Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample	11.100	

		2008	2009
<b>Camp 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds</b>			
1.1	Projecte del Parc Urbà "El Carrilet"		
1.8	Adequació de l'entorn de la pista esportiva de la plaça de l'estadi		
<b>Camp 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis</b>			
2.1	Instal·lació d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis de "La Sauleda"		
2.2	Substitució d'ascensors i rehabilitació façanes dels edificis del carrer Ample		
<b>Camp 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà</b>			
5.2	Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals		
5.5	Increment dotació de contenidors		
5.8	Programa d'informació i sensibilització per l'educació ambiental		
<b>Camp 6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments</b>			
6.2	Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones		
<b>Camp 7 Desenvolupament programes que comportin millora social, urbanística i econòmica</b>			
7.1.1	Cohesió social: Acollida al barri		
7.1.2	Cohesió social: Acolliment lingüístic per adults – Aules de barri		
7.1.3	Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris		
7.1.4	Cohesió social: Millora de la convivència en els espais comuns		
7.2.3	Igualtat d'oportunitats: Atenció infància: Lleure educatiu amb infants i adolescents		
7.4	Oficina de gestió Pla de Barris		
<b>Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques</b>			
8.3	Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda		
8.4	Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample		


- En fases preparatòries per a l'execució
- En execució
- Executat

# SEGUIMENT PLA FINANCER

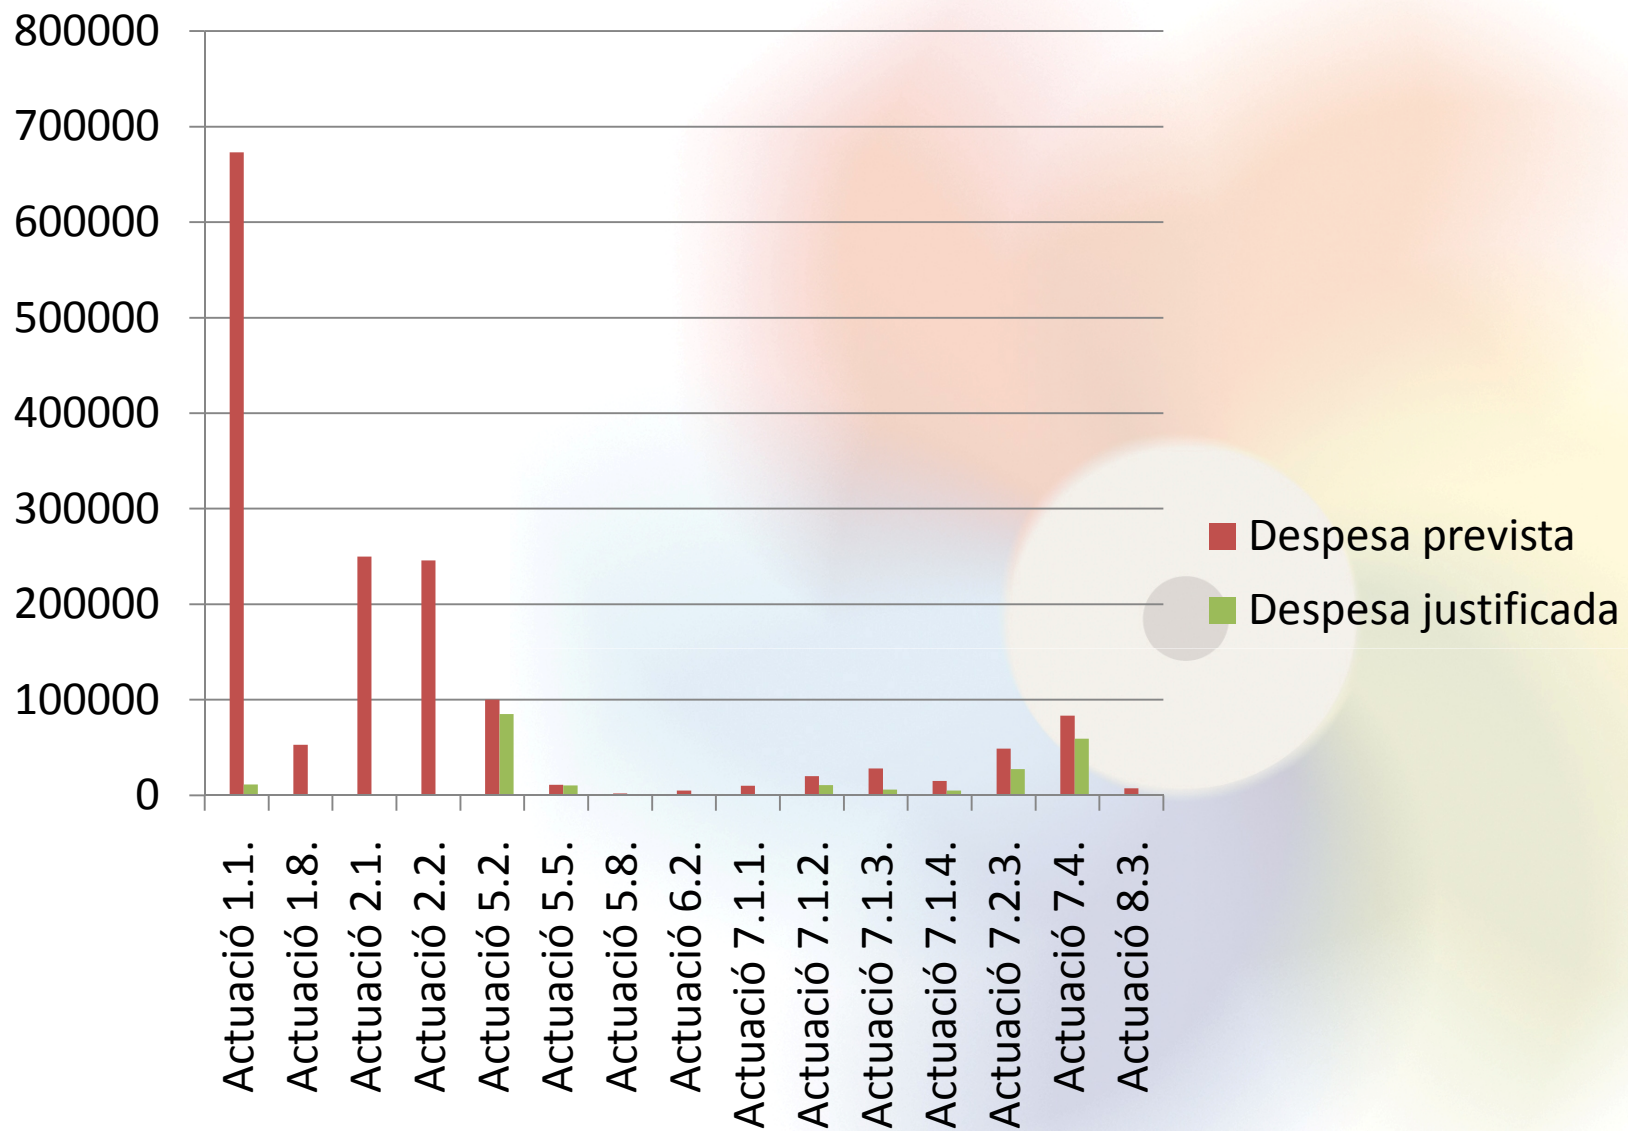

# SEGUIMENT PLA FINANCER

Actuacions amb un pressupost inferior a 50.000€

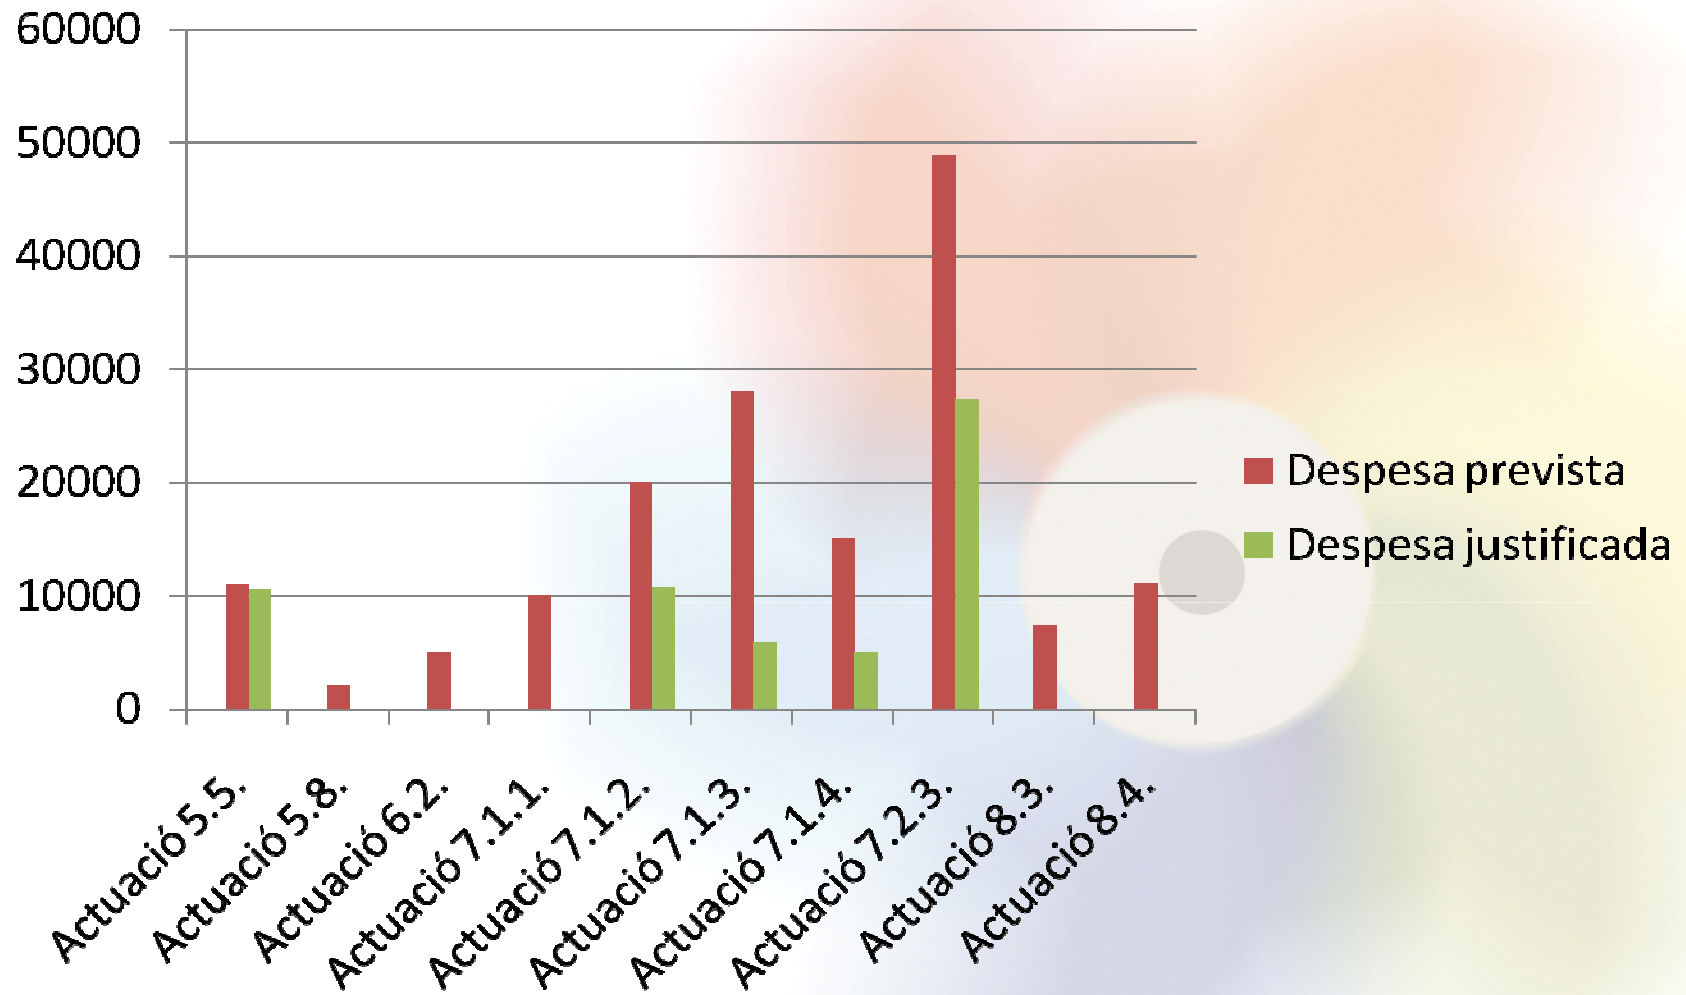

**SEGUIMENT PLA FINANCER**  
 Actuacions amb un pressupost inferior a 50.000€

<b>ACTUACIONS 2008 – 2009</b>	<b>Despesa prevista</b>	<b>Despesa Compromesa</b>	<b>Despesa justificada</b>
Actuació 1.1. Parc Urbà El Carrilet	672.874,75	37.700	11.310
Actuació 1.8. Adequació plaça de l'Estadi	52.925,40	50.279,14	0
Actuació 2.1. Instal·lació d'ascensors i rehabilitació de façanes La Sauleda	250.000	10.653,44	0
Actuació 2.2. Instal·lació d'ascensors i rehabilitació de façanes c/ Ample	246.000	4.554,74	0
Actuació 5.2. Instal·lació d'energia solar fotovoltaica Escola Bressol	100.000	93.410,80	85.200,18
Actuació 5.5. Increment dotació de contenidors	11.000	10.529,97	10.529,97
Actuació 5.8. Programa d'informació i sensibilització	2.000		0
Actuació 6.2. Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones	5.000	3.417,24	20,88
Actuació 7.1.1. Acollida al barri	10.000		0
Actuació 7.1.2. Acolliment lingüístic - Aules de Barri	20.000		10.746,99
Actuació 7.1.3. Millora de la convivència en els edificis comunitaris	28.000	10.962	5.900
Actuació 7.1.4. Millora de la convivència en els espais comuns	15.000	5.200	5.000
Actuació 7.2.3. Lleure educatiu amb infants i adolescents	48.797,8	35.800	27.369,91
Actuació 7.4. Oficina de gestió del projecte	83.394,97	85.900,92	59.323,07
Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a La Sauleda	7.400	11.099,83	0
Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats al c/ Ample	11.100	7.399,43	0




**ESTAT FINANCER GLOBAL**

	Despesa prevista	Despesa compromesa	% Despesa compromesa	Despesa justificada	% Despesa justificada
<b>2008</b>	225.537,82	210.419,17	<b>93,29%</b>	107.040,15	<b>47,45%</b>
<b>2009</b>	1.337.955,10	156.488,34	<b>11,69%</b>	108.360,85	<b>8,09%</b>
<b>TOTAL</b>	1.563.492,92	366.907,51	<b>23,46%</b>	215.401	<b>13,77%</b>

# ACTUACIÓ 1.1. PARC URBÀ

- ✿ Procés participatiu per a l'elaboració del projecte realitzat
- ✿ Projecte executiu aprovat
- ✿ Iniciat el procés de licitació per a la contractació de les obres

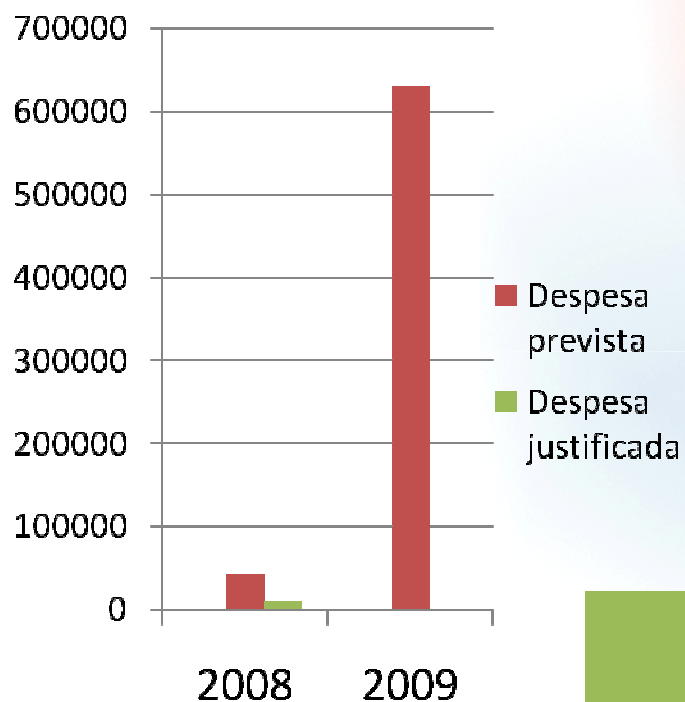

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008	43.112,42	37.700	11.310
2009	629.762,33		0

# ACTUACIÓ 1.1. PARC URBÀ



1era reunió Comitè d'avaluació i seguiment  
4 de novembre de 2009

- ✿ Procés participatiu per a l'elaboració del projecte realitzat
- ✿ Execució de les obres a punt de finalitzar
- ✿ Pendants de si el pressupost ens permet introduir algunes millores més suggerides pels veïns durant l'execució de les obres



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008	52.925,40	50.279,14	0

## ACTUACIÓ 2.1. EDIFICIS LA SAULEDA

- ✿ Procés engegat per al 2009 amb 2 de les 16 comunitats
- ✿ TEDI realitzat a les dues comunitats
- ✿ Projecte de rehabilitació i instal·lació d'ascensors redactat
- ✿ En procés de sol·licitud d'ajuts al Departament de Medi Ambient i Habitatge
- ✿ En procés de redacció de les bases de convocatòria d'ajuts de l'ajuntament
- ✿ Treball de suport i acompanyament a les comunitats en aquest procés

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	250.000	10.653,44	0



## ACTUACIÓ 2.2.: EDIFICIS C/ AMPLE

- ✿ Procés engegat per al 2009 amb les 2 comunitats d'aquesta zona
- ✿ TEDI realitzat a les dues comunitats
- ✿ Projecte de rehabilitació i instal·lació d'ascensors en procés de redacció
- ✿ En procés de sol·licitud d'ajuts al Departament de Medi Ambient i Habitatge
- ✿ En procés de redacció de les bases de convocatòria d'ajuts de l'ajuntament
- ✿ Treball de suport i acompanyament a les comunitats en aquest procés

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	246.000	4.554,74	0



## ACTUACIÓ 5.2.: PLAQUES SOLARS

- ✿ Instal·lació de les plaques solars fotovoltaïques
- ✿ Conveni entre l'ajuntament i Endesa per a l'energia produïda
- ✿ Aquesta setmana hem rebut l'autorització per fer la connexió de la instal·lació a la xarxa
- ✿ Manca per finalitzar l'execució de l'actuació la monitorització



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008	100.000	93.410,80	85.200,18

## ACTUACIÓ 5.5: INCREMENT CONTENIDORS

- ✿ La ubicació dels contenidors es va decidir en base al treball entre veïns/es, entitats i tècnics
- ✿ Els 4 grups de nous contenidors per a la recollida selectiva ja estan a la ubicació decidida
- ✿ Actuació ja executada

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2008	11.000	10.529,97	10.529,97





**ACTUACIÓ 5.8: INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ**

- ✿ Celebració de la Festa del Reciclatge a la Plaça de l'Estadi
- ✿ En procés de preparació del material per a dos punts d'informació ambiental situats als dos locals socials de l'àmbit d'actuació del PB
- ✿ En procés de preparació d'una campanya de sensibilització a la recollida de la fracció orgànica
- ✿ S'està organitzant una sortida a la deixalleria municipal per abans de nadal




**FESTA DEL RECICLATGE**  
**DISSABTE 3 D'OCTUBRE DE 2009**  
**DE 10 A 13 H MATÍ**  
**PLAÇA ESPORTS PALAFRUGELL**



**INFLABLE DE RESIDUS**  
**TALLERS DE RECICLATGE DE RESIDUS**  
**PUNT D'INFORMACIÓ AMBIENTAL**  
**T'ho perdràs?**

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	2.000		0

# ACTUACIÓ 6.2.: BUTLLETÍ DEL BARRI

- ✿ Els tres tallers formatius que formen part del projecte ja estan en funcionament
- ✿ El grup que conforma el consell de redacció del butlletí, 10 dones en l'actualitat, ja està treballant en el 1er número, que sortirà el desembre de 2009.



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	5.000	3.417,24	20,88

1era reunió Comitè d'avaluació i seguiment  
4 de novembre de 2009

- ✿ Els treballs de redacció i preparació de la Guia d'Acollida estan ja finalitzats.
- ✿ La guia està en procés d'edició i la presentació es realitzarà en breu.
- ✿ Tant bon punt se n'hagi fet la presentació s'iniciaran les sessions d'acollida per a persones nouvingudes.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	10.000		0

- ✿ La 1era quinzena d'octubre es va obrir el període de matriculació a les Aules de Barri.
- ✿ Aquest curs 2009-2010 han incrementat el número d'inscripcions.
- ✿ Degut a aquest motiu enguany s'han posat en marxa dos grups de 15 alumnes cada un.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	20.000		10.746,99

- ✿ L'actuació s'està executant des del mes d'abril, amb la presència d'un mediador a l'oficina del Pla de Barris.
- ✿ Des d'aquesta actuació s'està duent a terme:
  - Un treball diagnòstic amb els presidents de comunitats de propietaris per a la preparació de la intervenció per a la millora de la convivència.
  - Mediació en conflictes interpersonals
  - Treball de mediació en les Comunitats de Propietaris
  - Preparació d'una guia d'habitatge conjuntament amb l'oficina municipal d'habitatge

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	28.000	10.962	5.900

Aquesta actuació consta de tres activitats:

Estan en execució:

- ✿ Projecte del Servei de Mediació de Creu Roja Palafrugell que es du a terme dins l'àmbit d'actuació del Pla de Barris.
- ✿ Taller Cuines del Món al CEIP Carrilet en col·laboració amb l'AMPA del centre.

En preparació i planificació:

- ✿ Projecte Voluntariat per l'acollida amb Creu Roja Palafrugell



	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	15.000	5.200	5.000

## ACTUACIÓ 7.2.3.: LLEURE INFANTS I ADOLESCENTS

En execució:

- 🌸 Treball de carrer per part de l'Equip d'Educadors
- 🌸 Lleure infantil. S'iniciaran les activitats de lleure els dissabtes a la tarda al barri, en col·laboració amb diferents entitats del municipi, el proper 7 de novembre.

	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	48.797,80	35.800	27.369,91

# ACTUACIÓ 7.4.: OFICINA GESTIÓ PROJECTE

✿ Oficina de Gestió del Pla de Barris La Sauleda – carrer Ample, en funcionament des del mes de febrer de 2009.




	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
2009	83.394,97	85.900,92	59.323,07

1era reunió Comitè d'avaluació i seguiment  
4 de novembre de 2009





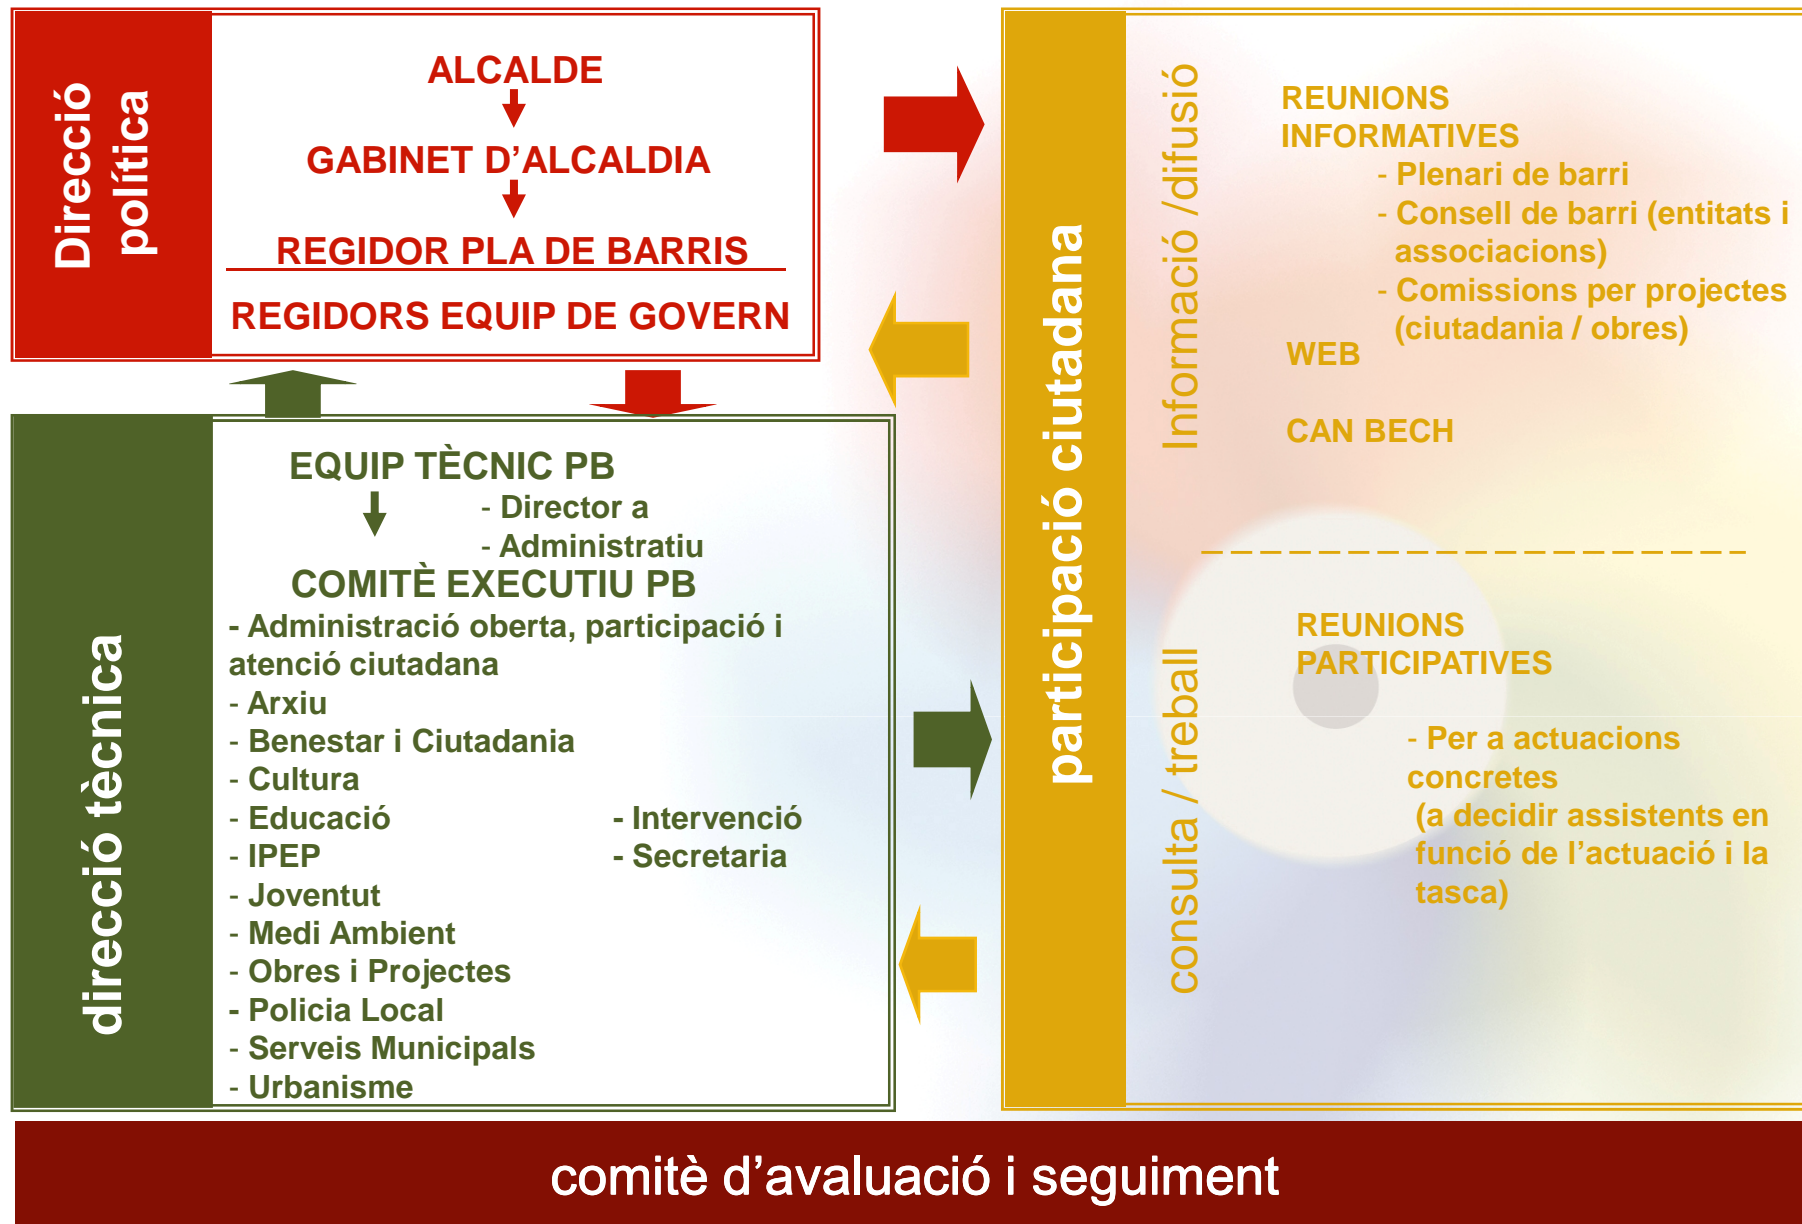


**ACTUACIÓ 8.3.: PASSOS ELEVATS LA SAULEDA**  
**ACTUACIÓ 8.4.: PASSOS ELEVATS C/ AMPLE**

- ✿ Procés participatiu per a la ubicació dels passos elevats realitzat
- ✿ Projectes aprovat i contractació realitzada
- ✿ Execució prevista dins la 1era quinzena de novembre de 2009

2008	Despesa prevista	Despesa compromesa	Despesa justificada
Actuació 8.3.	7.400	11.099,83	0
Actuació 8.4.	11.100	7.399,43	0

**ALTRES ACCIONS  
NO INCLOSES DIRECTAMENT EN EL  
PROJECTE DEL PLA DE BARRIS**



### SOC

Treball als barris 2008:

- Subvenció de 27.045,55€ per a la contractació del Director tècnic del projecte

Treball als barris 2009:

- Sol·licitud de 4 programes. Amb un import total sol·licitat de 138.118,89€.  
Pendent de resolució

### Departament de Medi Ambient i Habitatge

- Signatura del conveni entre l'ajuntament de Palafrugell i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, per a la rehabilitació i l'equipament d'elements col·lectius (ascensors i façanes) del Pla de Barris La Sauleda – carrer Ample.

### Direcció General de Participació

- Subvenció de la Subdirecció de Participació ciutadana en l'àmbit local, per a l'execució del projecte "Procés participatiu de millora del barri".  
Subvenció atorgada: 14.461€
